

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

000268

**PROGRAMA:** PROGRAMA PRESUPUESTARIO U151 "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

**CONTRATO:** MVC-832051978-E2-2024

**CONSTRUCTOR:** KAREN GURROLA ROMERO

En la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la calle Hidalgo, siendo las 14:00 horas del día 26 del mes de marzo de 2024. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, KAREN GURROLA ROMERO Y LA C. MA. ROSARIO CORONADO RÍOS; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

### **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE GUERRERO Y AVENIDA ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Cabecera Municipal

Municipio: Villa de Cos

Programa: PROGRAMA PRESUPUESTARIO U151 "REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA" DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: KAREN GURROLA ROMERO

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

<b>FECHA DE INICIO</b>	05	MARZO	2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	25	MARZO	2024

000269

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 250 KG/CM2, GUARNICIONES Y BANQUETAS.

**EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

**DEMOLICIÓN Y TERRACERÍAS**

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFALTICO, ADOQUÍN Y BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA CONCRETO SIMPLE DE 10 A 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CORTE DE CAJÓN HASTA 35 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL TIPO B INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DEL SITIO.


ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 3.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES POR KILOMETRO SUBSECUENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, ESQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA DEPOSITARLO EN EL LUGAR DE DESTINO

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.

**PAVIMENTOS**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE ARROYO DE CALLE CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: NIVEL, ESTACIÓN, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

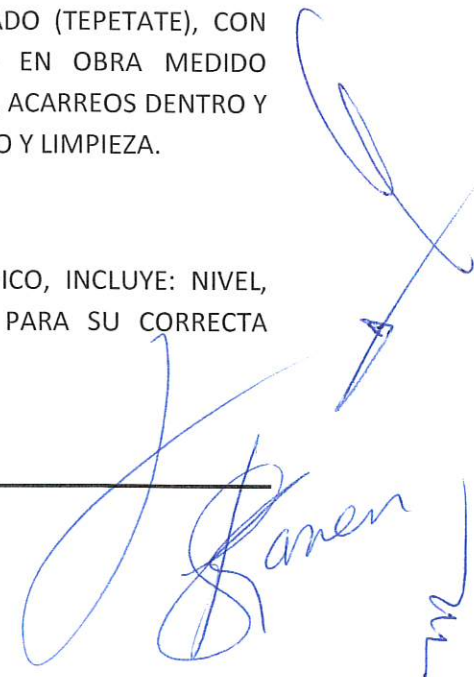

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

000270

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURA DE 40 X 80 CM, FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO DE VINIL, PARA MURO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, FABRICADA CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, FONDO DE VINIL, POSTE PTR 2X2 INCLUYE ANCLAJE EN PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PINTURA TRAFICO EN TOPES Y/O CRUCES BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILUYENTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

#### **GUARNICIONES Y BANQUETAS**


GUARNICIÓN DE 20 CM. DE BASE X 30 CM. DE ALTURA Y 15 CM. DE CORONA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA COMÚN DE CONTACTO, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBIADO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PINTURA TRAFICO EN GUARNICIÓN BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILUYENTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

#### **LIMPIEZA**

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PESADO, PIEDRA, CASCAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

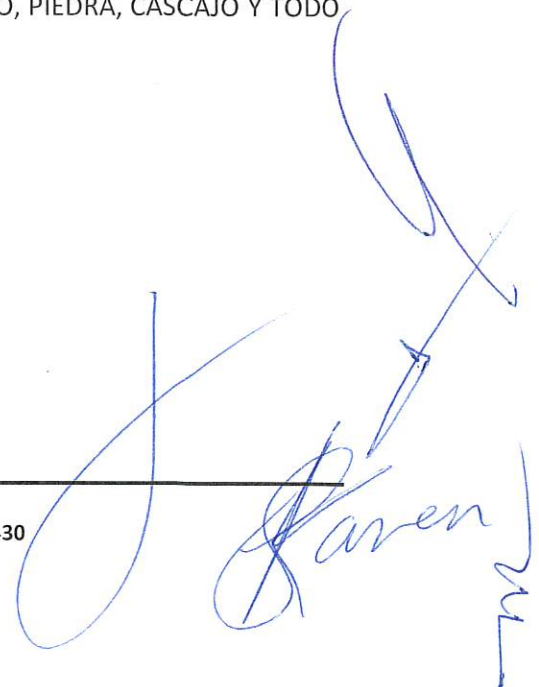

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

000271

CONVENIO	FECHA	MONTO
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023.	05/03/2024	\$ 1'111,015.15

EJERCIDA:

CONVENIO	FECHA	MONTO
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023.	25/03/2024	\$ 1'111,015.15


INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 1'111,015.15

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 y/o FINIQUITO		05/03/2024	25/03/2024	\$1'111,015.15	\$1'111,015.15
<b>IMPORTE TOTAL CON IVA</b>					<b>\$1'111,015.15</b>

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

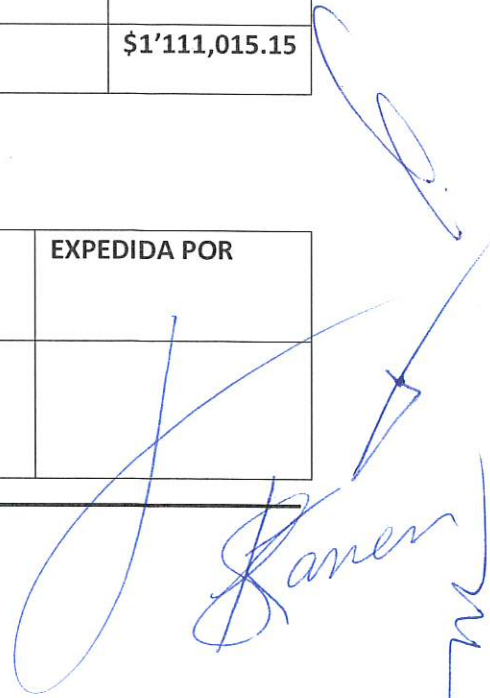

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2267458 05/03/2024	\$ 111,101.51	CHUBB FIANZAS MONTERREY

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2267462 26/03/2024	\$ 111,101.51	CHUBB FIANZAS MONTERREY

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

**DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

PLANOS: NO APLICA  
 MANUALES: NO APLICA  
 INSTRUCTIVOS: NO APLICA  
 CERTIFICADOS: NO APLICA  
 GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO  
 ARCHIVOS: NO APLICA



Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: KAREN GURROLA ROMERO

FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

000274

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: \_\_\_\_\_



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: MA. ROSARIO CORONADO RÍOS

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: \_\_\_\_\_

Ma. Rosario Coronado

\_\_\_\_\_
